



2018



凭祥市中等职业技术学校 商务外语示范特色专业及 实训基地项目验收 总结报告





2018



概述



几年来共投入建设资金约450万元，到2018年6月底共完成大项任务6项、小项任务16项(共20项)，任务完成率达80%。



2018



一、项目完成情
况及总体质量

二、项目资金
管理情况

主要
内容

五、建设、管理和
功能发挥的其它典
型经验

四、项目效益

三、项目组
织管理水平



2018

一、项目完成情况及总体质量



(一) 教学改革完成情况

人才培养模式



专业



车间



项目

推进工作导向课程体系






2018

师资队伍建设

一、项目完成情况及总体质量

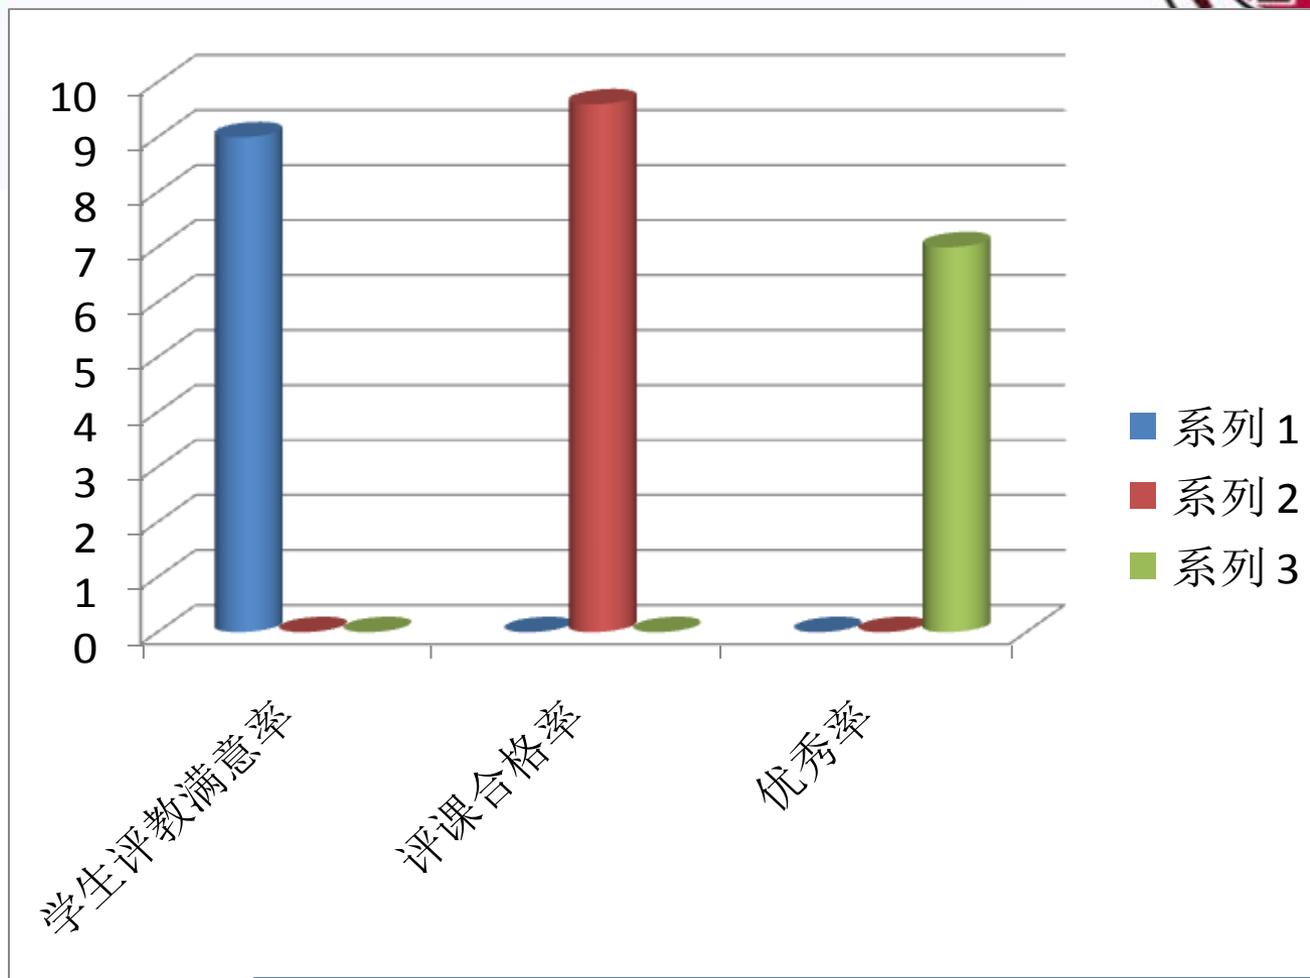

三年中，共安排108人次到企业实践，支持6名教师参加国培和省培。



2018

一、项目完成情况及 总体质量



1)校企合作空间
进一步拓展

2)校企合作机制
进一步完善

校企合
作服务

4)订单培养规模
进一步扩大

3)校企合作交流
渠道更加畅通



2018

一、项目完成情况及 总体质量



(二) 实训基地 建设完成情况


1. 设备安装及 运行情况

签订合同



2015年1月22日所有设备全部到校，2015年3月13日，凭祥市教育局仪器站、财务股及市财政局等监督部门和学校验收小组进行总验收（货物验收）：合格。

安装调试






2018



从2015年5月4日起，各厂商进场施工及安装调试设备。
2015年6月3日，所有设备安装调试结束并试运行，大多数软件培训结束，学校验收小组对设备进行整体验收：
合格。

整改



2016年8月2日，学校邀请市财政局、市教育局、中标商有关人员来校进行商务外语示范特色专业实训设备复检验收工作。复检结果：**设备运行一年后，经现场检测，正常。**



2018

一、项目完成情况及 总体质量



2.设备配置的合理性及购置的经济合理性。
本项目设备共新建商务外语技能仿真模拟实训室、商务外语多功能综合实训室、商务外语互动展示体验实训室、礼仪训练室各一间。




- (1) 专家组初审《建设方案书》（6月7日）
- (2) 学校修订《建设方案书》（6月10日）
- (3) 专家组复审《建设方案书》（6月13日）
- (4) 专家组对《建设方案书》提出修改意见（6月18日，意见提出人：林清



2018

一、项目完成情况及 总体质量



- （6）学校修订《建设方案书》（6月18日—7月20日）
- （7）专家组对《建设方案书》提出修改意见（7月25日，意见提出人：彭友生 陈锐亮）
- （8）自治区职成处审批、备案，并将定稿的《建设方案书》发给项目学校（8月5日）
- （9）学校打印上报经审批、备案的《建设方案书》（8月8日）



2018

二、项目资金管理情况



(一) 资金落实情况

凭祥市公立学校的所有资金由凭祥市财务股统一管理，学校没有帐户。

本项目省级专项经费：**500万元。**
学校自筹：约**15万元**；市配套资金约**15万元**。



2018

二、项目资金管理情况



- 1.凭祥市教育局于**2014年6月10日**向凭祥市财政局呈报（凭教报〔**2014**〕**52号**）文件。
- 2.凭祥市财政局教科文股于**6月10日**作出拟办意见：经核实，上级下达我市（桂财教〔**2014**〕**62号**）**2014年自治区职业教育专项经费500万元**。
- 3.凭祥市人民政府**6月12日**批复意见：建议同意市财政局意见。
- 4.凭祥市教育局办公室**6月17日**批复：请职校尽快拟出实施方案呈局领导审定，并报市政府审定后报市财政局备案。



2018

二、项目资金管理情况



5.学校于9月2日向凭祥市教育局上报《关于要求拨给2014年度自治区职业教育专项经费的请示》

6.9月25日，我校向区厅派出的专家组如实汇报了项目建设的进展情况，专家组对项目执行的主体作出了明确的指示，即项目的执行主体是学校而不是凭祥市教育局，并对下一步的工作作出了非常明确的要求。




2018



(二) 资金支出情况

1. 预算执行与批复的相符性。

项目专项资金500万

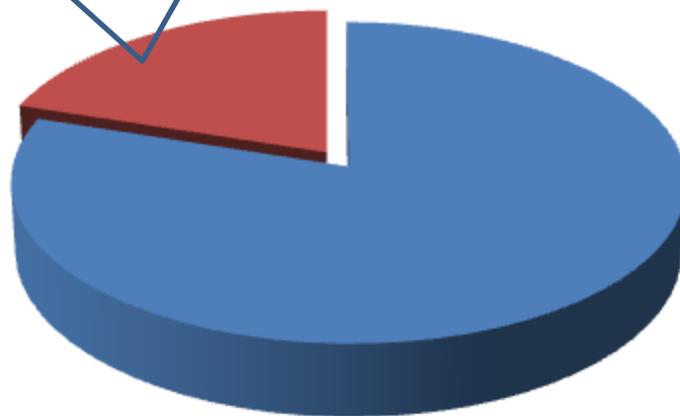

■ 设备部分占80%
■ 教学改革占20%

其中，品牌课程开发项目35万元、师资队伍建设项目65万元。



2018

二、项目资金管理情况



2. 实际支出调整的合理性。

- (1) 设备部分项目预算为400万元，实际支出：399.67万元；
- (2) 品牌课程开发项目预算为35万元，实际支出：0万元；
- (3) 师资队伍建设项目预算为65万元，实际支出：0万元。



2018

二、项目资金管理情况



设备采购部分的合同成交金额为：**399.67**万元。支出情况如下：

(1) 2015年4月9日，中标商告知学校得到凭祥财政局拨付的第一笔货款：**100**万元。

(2) 2015年5月18日，中标商告知学校得到凭祥财政局拨付的第二笔货款：**50**万元。

(3) 2015年9月2日中标商告知学校得到凭祥财政局拨付的第三笔货款：**100**万元，表示了强烈的不满，同时寄来了第六次的催款函。



2018

二、项目资金管理情况



设备采购部分的合同成交金额为：**399.67**万元。支出情况如下：

4) 2015年10月份后，关于拨款问题，学校建议中标商直接跟凭祥市财政局、教育局核算中心联系。

(5) 据凭祥市教育局财务股反馈，2015年10月至2016年3月，分别拨款：50万元、39.7195万元、39.967万元，尚有5%的质保金即19.9835万元未支付。

(6) 2016年8月12日，学校向市教育局提交请款申请书，请求市教育局支付中标商质保金19.9835万元。



2018

二、项目资金管理情况



设备采购部分的合同成交金额为：**399.67**万元。支出情况如下：

(7) 2016年6月16日，学校将精品课程项目开发、师资队伍项目建设的《一般政府采购计划表》和《关于使用资金进行示范专业项目建设的函》分别报送市教育局、市财政局。市教育局财务股拟出：以上两项建设资金从桂财教〔2014〕62号2014年自治区职业教育发展专项经费（职业学校实训基地设备购置）1203135中分别安排35万元、65万元。同时，学校拟以上两个项目进入招标阶段，在向市财政局申请备案。该子项目在艰难进行中。



2018

三、项目组织管理水平



(一) 管理机构的健全性

1.成立了项目建设领导小组

- 2.成立了项目建设办公室
- 3.成立项目建设管理组
- 4.成立项目建设专家指导委员会



2018

三、项目组织管理水平



1. 建立项目建设例会制度

2. 建立多方参与的质量监控组织体系

3. 定期接受各级主管部门的中期检查

4. 加强信息交流与共建共享

(二) 管理制度的健全性和操作性。



2018

三、项目组织管理水平



（三）组织实施的情况及项目管理水平。

项目实施方案中的九个工作小组，按职责分工、各司其职，互相合作、互相监督、互相制约、廉洁自律，项目工作小组从拟购设备参数制定、询价、招标投标工作、设备采购入场、安装调试、业务培训、检测验收等各个环节，全员参与、全程参与，确保项目实施过程中公开、透明，按时、保质、保量，符合中标合同与专业建设要求。



四、项目效益

2018



（一）实施技能型紧缺人才培养情况。

1. 学历教育规模进一步巩固。
学校坚持内涵发展、特色发展之路，吸引力进一步增强，全日制教育年招生人数仍保持在**200**名左右。
2. 毕业生就业质量进一步提高。
本专业学生当年就业率保持**81.5%**，其中，对口就业率、本地就业率、顾客满意率均保持在**90%**以上。





四、项目效益

2018



(二) 职业培训情况。

职业培训能力进一步增强。学校主动加强与人社和劳动、工会、扶贫等部门的联系，加强与企业的联系与合作，开展农村劳动力转移等项目的培训，扩大岗前培训和在职培训，职业培训规模达到**140**人次/年。





四、项目效益

2018



(三) 实训设备利用率。

1. 商务外语技能仿真模拟实训室设备利用率**80%**;
2. 商务外语多功能综合实训室设备利用率**90%**;
3. 商务外语互动展示体验实训室设备利用率**100%**;
4. 实训室礼仪训练室设备利用率**95%**。





四、项目效益

2018



（四）对学校专业建设的作用。

- 1.进一步完善了学校商务外语专业群的建设条件；
- 2.提高了商务外语专业专任教师的专业建设能力；
- 3.提高了商务外语专业专任教师信息化教学能力；
- 4.丰富了商务外语专业的教学手段；



四、项目效益

2018



（四）对学校专业建设的作用。

- 5.提高了商务外语专业的教学效果；
- 6.全面提高了商务外语专业的学生的语言能力；
- 7.提高了学生的综合素质；
- 8.带动了学校其他专业的发展。



四、项目效益

2018



(五) 科技创新情况及效果。

1. 商务外语技能仿真模拟实训室的教学终端设备使用可以移动的手提电脑，课桌椅设计成根据需要；
2. 商务外语技能仿真模拟实训室安装有商务英语 3 D 仿真教学软件；
3. 商务外语互动展示体验实训室的多功能触摸一体机；
4. 商务外语多功能综合实训室的课桌设成六人座六角形式，便于开展小组教学活动。





四、项目效益

2018



(六) 示范辐射作用。



1. 商务外语示范专业及实训基地的建成后，扩大了学校国际化办学规模。
2. 商务外语示范专业及实训基地的建成后，增强了对国内职业院校的吸引力。
3. 商务外语示范专业及实训基地的建成后，促进了学校的培训工作，社会效益和经济效益取得良好效果。



2018

五、建设、管理和功能发挥的其它典型经验



- 1.促进学校的招生工作，特别是吸引了越南籍零起点汉语学生到我校学习汉语，从2014年的10名学生，至2018年已经发展到近40人。
- 2.实训基地的投入使用，全面提升了学生的综合素质，提高商务外语专业学生的就业竞争力。
- 3.提高了学校对外服务能力，有了实训基地，学校可以承担更多的企事业培训工作。



2018



谢谢大家

